

Valtraloc Flamatt – 30.11.2023

Letzte und aktuelle Arbeiten

Trotz den schlechten Wetterbedingungen von diesem Jahresende setzt die Unternehmung alle Mittel ein, um die aktuellen Phasen fertigzustellen. Die Phase 1.1 (Bau vom Kreisel unter der Autobahnbrücke) konnte wetterbedingt nicht genau nach plan fertiggestellt werden denn der definitive Belag konnte erst am 27.11.23 eingebaut werden. Die Phase 1.2 (Neueneggstrasse) wurde also parallel gestartet, um sicherzustellen, dass bis zur Winterpause die Neueneggstrasse wiedereröffnet wird.

Phase 1.1



- Belagseinbau um den Kreisel auf der Südseite ist erfolgt
- Kreiselmauer ist auf der Südseite fertiggestellt
- Vorbereitungen für den Bau vom befahrbaren Kreiselerling sind im Gange
- Provisorische Markierungen auf der Südseite vom Kreisel, um den Verkehr auf dieser zu führen.

Phase 1.2

- Diverse Werkleitungsarbeiten werden erledigt
- Bau vom Kreisel auf der Nordseite ist am Laufen
- Fräsen vom restlichen Belag auf der Neueneggstrasse



Aktuelle Verkehrsphase

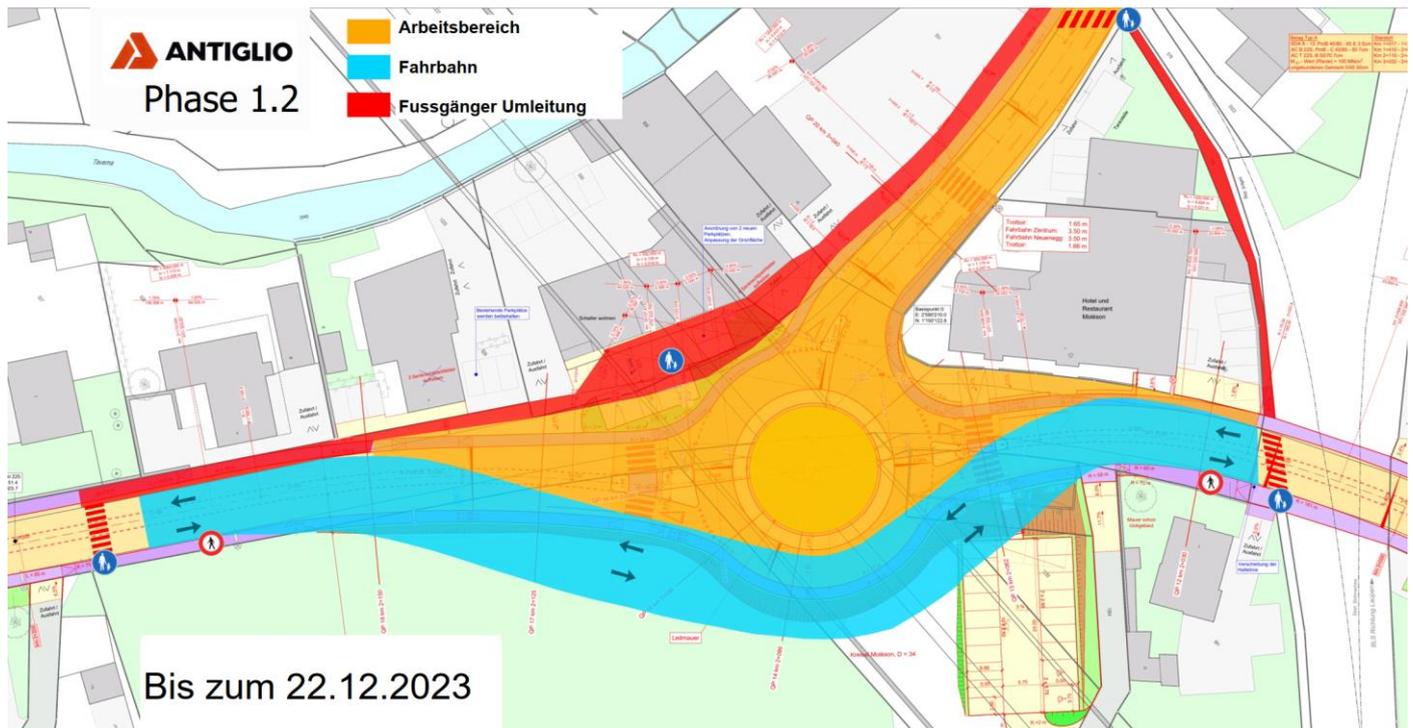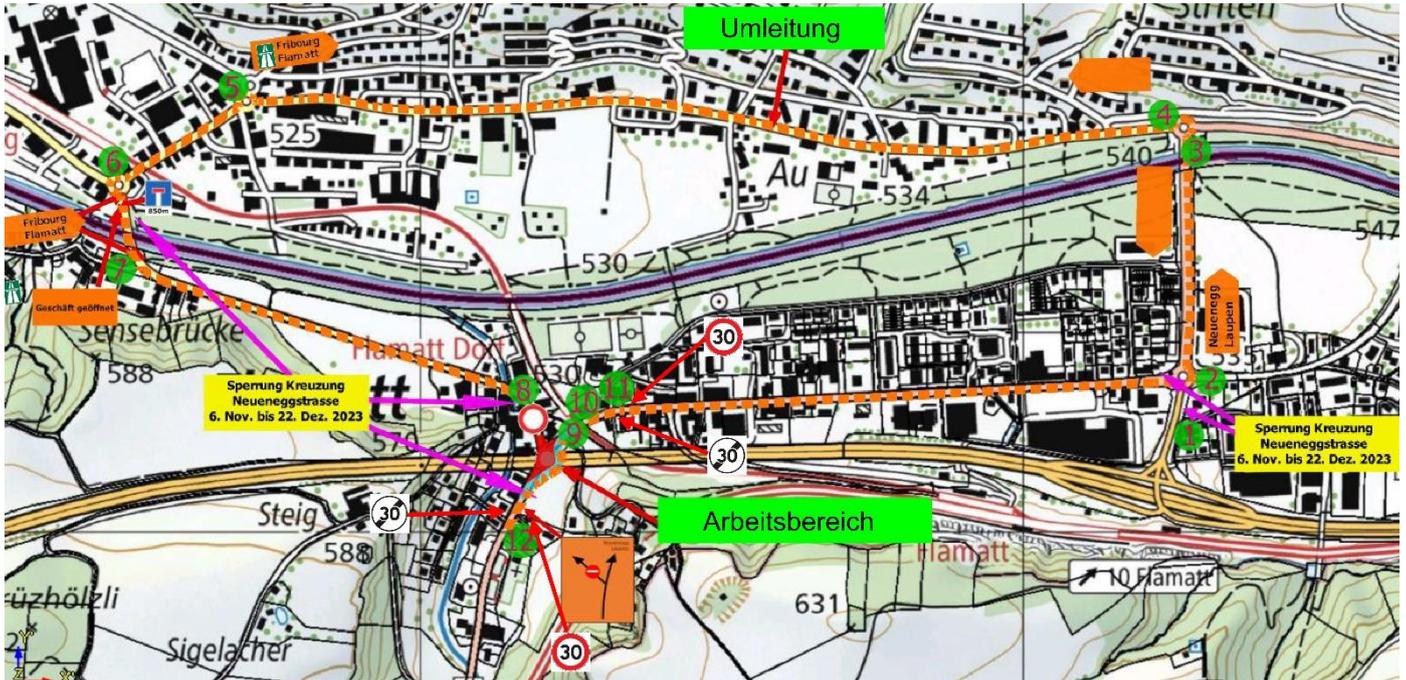

Wichtige Infos

Aktuell ist die Neueneggstrasse gesperrt. Die Geschwindigkeit im Kreisbereich wird auf 30 km/h reduziert, um die Sicherheit aller Teilnehmer zu gewährleisten. Wie hier oben ersichtlich, ist eine Umleitung über Neuenegg signalisiert.

Anstehende Arbeiten

Die kommenden Arbeiten sind die folgenden:

Phase 1.1

- Schalen, armieren und betonieren vom befahrbaren Kreislering
- Belagsarbeiten, um den Kreisler vor Weihnachten provisorisch in Betrieb zu nehmen
- Vorbereitungen für die Winterpause

Phase 1.2

- Fertigstellung der Werkleitungsarbeiten
- Bau vom Kreisler auf der Nordseite fertigstellen
- Ersatz der Strassenfundationsschicht und Bau der Bordüren auf der Neueneeggstrasse
- Belagsarbeiten, um die An- und Ausfahrt von und nach Neuenegg zu gewährleisten
- Vorbereitungen für die Winterpause

Kommende Verkehrsphase – ab 22.12.23 (Winterpause)

