

# Valtraloc Flamatt – 31.10.2023

## Letzte Arbeiten

Die aktuelle Phase (1.1), die den Bau vom Kreisel unter der Autobahnbrücke und diverse Umgestaltungsarbeiten beinhaltet, ist in vollem Gange.

- Die meisten Werkleitungsarbeiten sind erledigt.
- Die Etappen 1 bis 4 vom Fundament des neuen Kreisels um die Pfeiler der Autobahnbrücke sind betoniert.
- Die Strassenverbreiterung, die den Verkehrsfluss zwischen Wünnewil und Flamatt in der nächsten Teilphase gewährleistet, ist ausgehoben und der Strassenkoffer ist erstellt.





## Anstehende Arbeiten

Die kommenden Arbeiten sind die Folgenden:

- Feinplanie der provisorischen und definitive Strasse um den Kreisel
- Belagseinbau der provisorischen und definitive Strasse um den Kreisel
- Betonieren der Kreisel-Leitmauer mit einer runden vorgefabrizierten Schalung
- Wechsel in die Bauphase 1.2, mit der Schliessung der Neueneggstrasse und einer Umleitung über Neuenegg
- Arbeiten in der Neueneggstrasse und Kreisel fertigstellen

## Kommende Verkehrsphase – 1.2 ab 06.11.23.

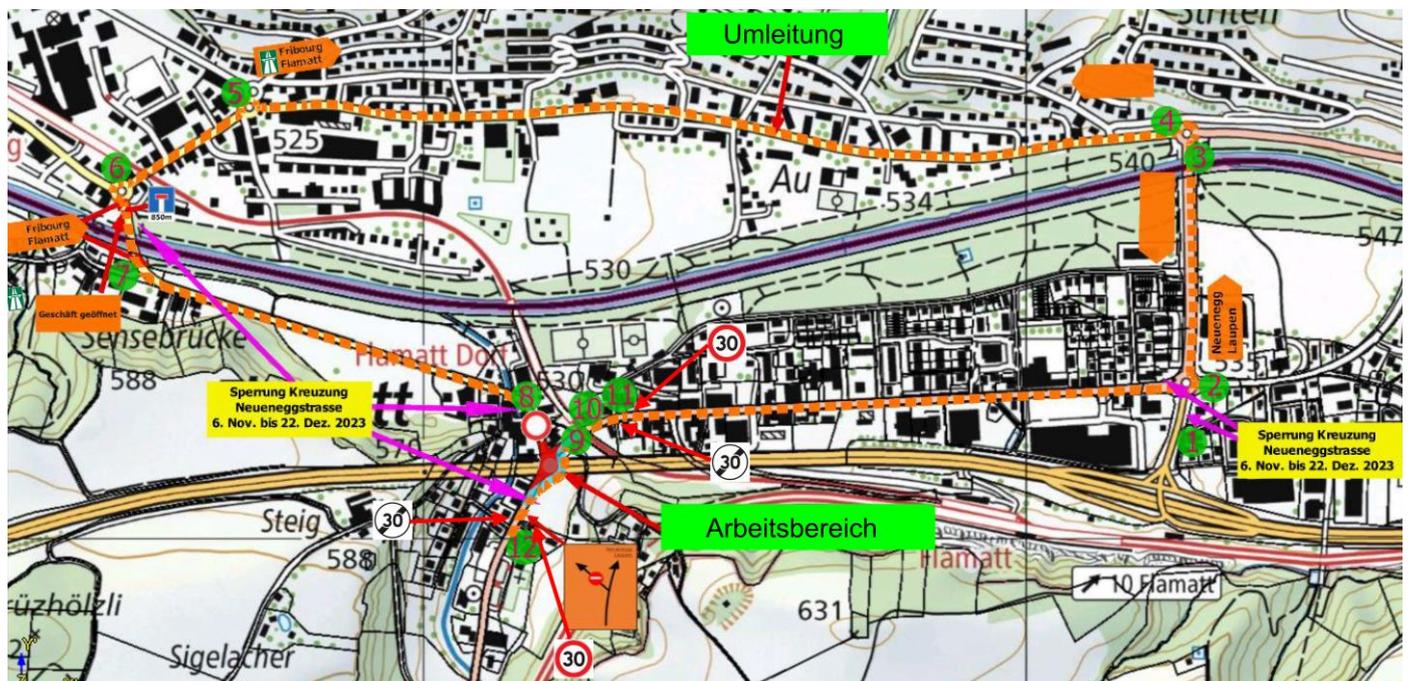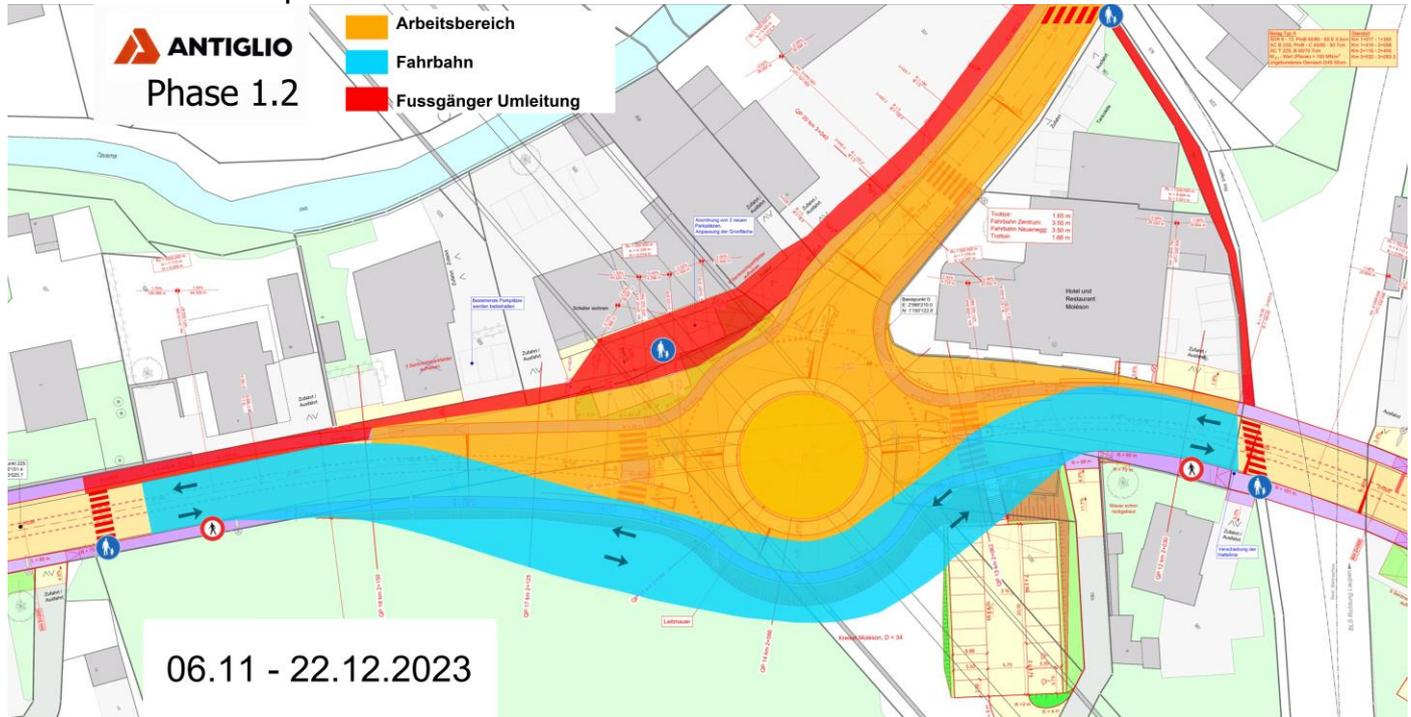

## Wichtige Infos

In der nächsten Bauphase wird die Neueneggstrasse gesperrt. Die Geschwindigkeit im Kreisbereich wird auf 30 km/h reduziert, um die Sicherheit aller Teilnehmer zu gewährleisten. Wie hier oben ersichtlich, ist eine Umleitung über Neuenegg geplant.
