

# Valtraloc Flamatt Stand 10. Juli 2024

## Letzte und aktuelle Arbeiten

### Kreisel und Freiburgstrasse

- Beim Trottoir vom Restaurant Moléson wurde der Belag eingebaut
- Kleine Fertigstellungsarbeiten
- Montage der definitiven Signalisation



### Bernstrasse

#### Etape 3.1-3.2

- Anpassung der Einlaufschächte der Etappe 3.1 ist abgeschlossen
- Bordüre der Bushaltestelle mit Entwässerung vor dem Polizeiposten ist erstellt
- Randsteine der Etappe 3.1 sind erstellt
- Belagseinbau in Kleinetappen auf dem Trottoir und den Anschlusszonen hinter dem Trottoir der Etappe 3.1 sind im Gange
- Arbeiten beim neuen Parkplatz vom Restaurant Waage sind abgeschlossen
- Bau der neuen Stützmauer beim Restaurant Waage ist im Gange



## Etappe 6.1-6.2


- Abbrucharbeiten der Bordüren und Anpassungen der bestehenden Einlaufschächte ist erfolgt
- Erstellen der Bordüren auf der Etappe 6
- Belageinbau auf dem Trottoir und hinter dem Trottoir der Etappe 6 im Gange
- Bau der Bordüre der Migros Busshaltestelle ist fertig



## Aktuelle Verkehrsphase

### Etappe 3 (Bereich Dorfzentrum):

Im Dorfzentrum wurde eine Einbahn eingeführt, um die Arbeiten mit der grösstmöglichen Sicherheit und Qualität auszuführen. Es wurde eine Umleitung über Neuenegg erstellt und signalisiert. Die Geschwindigkeit im Baustellenbereich ist auf 30 km/h reduziert, um die Sicherheit aller Teilnehmer zu gewährleisten. Die Einbahn wurde wie folgt geplant und umgesetzt:

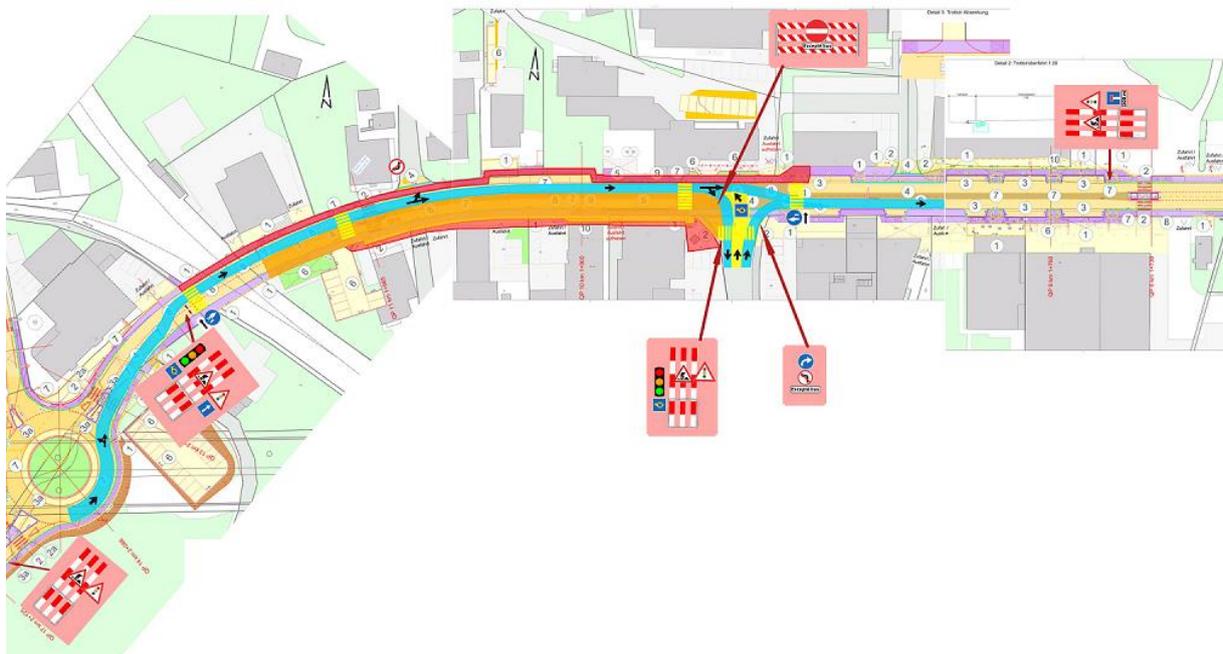

### **Etappe 6 (Bereich Coop Tankstelle bis Comet):**

Im Bereich der Etappe 6, wird der Verkehr zweiseitig geführt, hier ist die bestehende Strasse breit genug.

### **Anstehende Arbeiten**

Die kommenden Arbeiten sind die folgenden:

#### Kreisel und Freiburgstrasse

- Fertigstellungsarbeiten abschliessen
- Montage der definitiven Signalisation fertigstellen
- Der Belagseinbau der Deckschicht ist am Wochenende vom 24.-25.08.2024 geplant

#### Bernstrasse

##### Etappe 3.1-3.2

- Start der Abbrucharbeiten (Bordüren) und Vorbereitungen für den Bau der neuen Bordüren auf der Etappe 3.2
- Start der Fernwärmequerung mit Sondagen der bestehenden Leitungen
- Weitermachen mit den Trinkwasserquerungen auf der Etappe 3

##### Etappe 6.1-6.2

- Fertigstellen der Bordüren auf der Etappe 6
- Belagseinbau auf dem Trottoir und hinter dem Trottoir der Etappe 6
- Bau der Fundationschicht der Migros Bushaltestelle

## Etappe 5.1-5.2

- Start mit der Etappe 5.2 ab dem 19.08.24



### Kommende Verkehrsphase

Das ganze Dorf wird während der Sommerferien (01.08. – 16.08.24) komplett zugänglich sein, die Einbahnregelung wird für diese Periode aufgehoben und erst wieder ab Ende August auf der Etappe 3.2 umgesetzt.

### Etappe 3.2 (Bereich Dorfzentrum):

Analog zur Etappe 3.1, wird die Etappe 3.2 ab dem 26.08.24 einspurig geführt, die untenstehenden Termine sind Richtwerte und können noch ändern.



### Etappe 5.1 :

Start der Arbeiten ab dem 19.08.24 ohne spezielle Eingriffe in den Verkehr, der Verkehr wird in dem Bereich zweispurig geführt. (Analog zur aktuellen Etappe 6)

### **Wichtige Informationen - Strassensperrung**

Am Wochenende vom 24.-25. August 2024 wird die Freiburgstrasse bis nach der Brücke, die Neueneggstrasse vor der Mühle Rytz und der Kreisbereich bis zum Bahnübergang wieder gesperrt werden um die letzte Schicht (Deckschicht) einzubauen. Dies wurde so entschieden damit eine bestmögliche Qualität der Deckschicht erreicht werden kann.

#### **Zusammengefasst:**

**Schliessung 24.08.2024 um 03:00**

**Öffnung 25.08.2024 um 23:00**

**Diese Termine sind stark Wetterabhängig und können beim kleinsten Regenrisiko nicht ausgeführt werden. Der definitive Entscheid wird am 23.08.2024 gefällt. Reserve-Termin ist das Wochenende danach (31.08.-01.09.2024).**
