

# Valtraloc Flamatt – 31.03.2024

## Letzte und aktuelle Arbeiten

### Kreisel

- Werkleitungen (Entwässerung und Stromleitungen), Randsteine und Parkplatz Schaller Wohnen sind erledigt.
- Auf der Kreiselmauer wurde das Antigraffiti aufgebracht.
- Randsteine vor dem Hotel Molésou sind im Gange.



### Freiburgstrasse

- Die Bordüren des Trottoirs auf der Juraseite sind fertiggestellt und die Planie, beziehungsweise die Belageinbauten auf den Trottoir sind auch erstellt.



### Bernstrasse

- Momentan kein Arbeiten.

## Aktuelle Verkehrsphase



### Freiburgstrasse und Kreisel



Phase 1.3"

- Arbeitsbereich
- Fahrbahn
- Fussgänger Umleitung

11.03.2024 - 19.04.2024

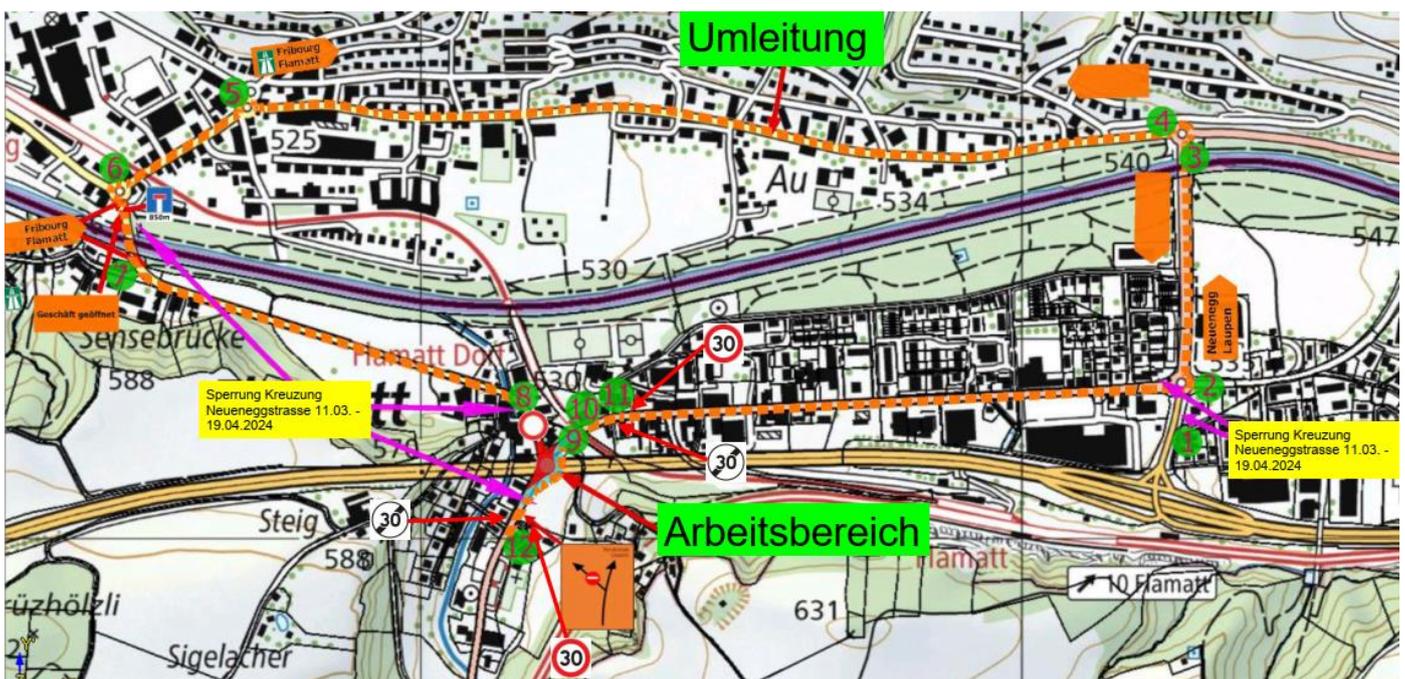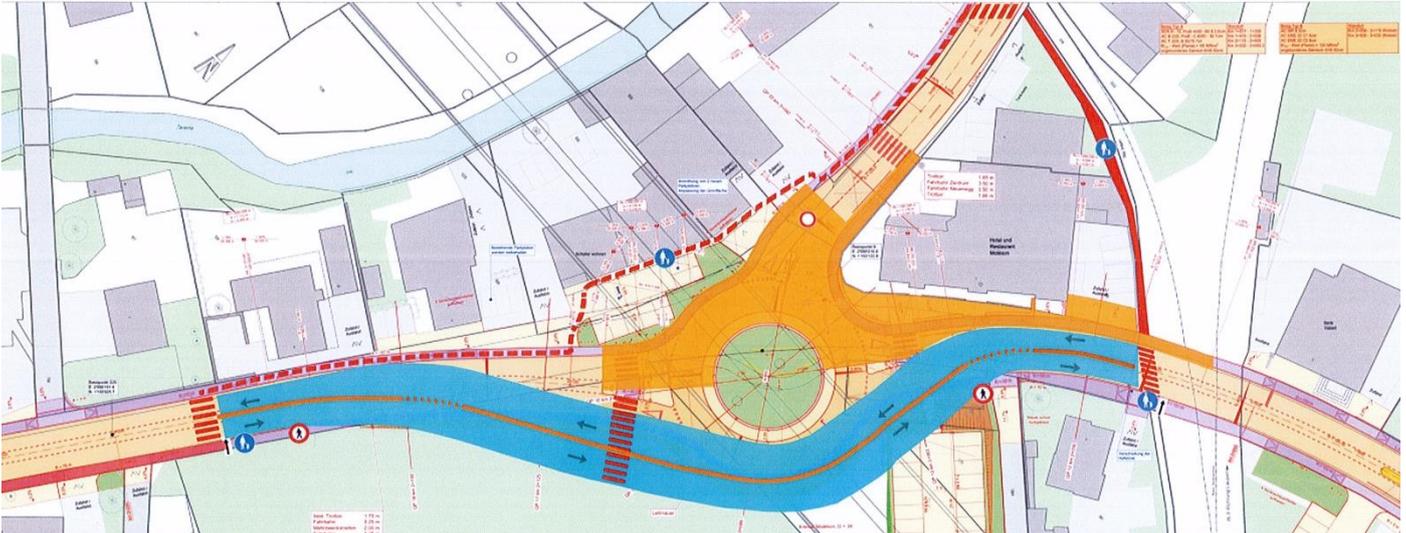

### Wichtige Infos

Bis am 19. April 2024 wird die Neueneggstrasse gesperrt sein und der Verkehr wird über Neuenegg umgeleitet gemäss dem Umleitungsplan hier oben.

Die Geschwindigkeit im Baustellenbereich ist auf 30 km/h reduziert, um die Sicherheit aller Teilnehmer zu gewährleisten.

## Anstehende Arbeiten

Die kommenden Arbeiten sind die folgenden:

### Kreisel

- Bordüren vor dem Hotel Moléson fertigstellen und Start mit der Umgebungsarbeiten von letzterem.
- Bau der Mittelinseln der Kreisel ein-ausfahrten.
- Planie für kommenden Belagseinbau

### Freiburgstrasse

- Diverse Kleinarbeiten

### Bernstrasse

- Ab Mitte April wird sich die Unternehmung auf dem neuen Parkplatz neben der Coop Tankstelle installieren um anschliessend diverse Strassenquerungen für die Wasserversorgung auf der Bernstrasse zu bauen.

### Neueneggstrasse

- Bau der Bremsschwelle auf der Neueneggstrasse.

## Kommende Verkehrsphase


### Kreiselbereich - Freiburgstrasse



Phase 1.3'

- Arbeitsbereich
- Fahrbahn
- Fussgänger Umleitung

15.04.2024 - 19.04.2024

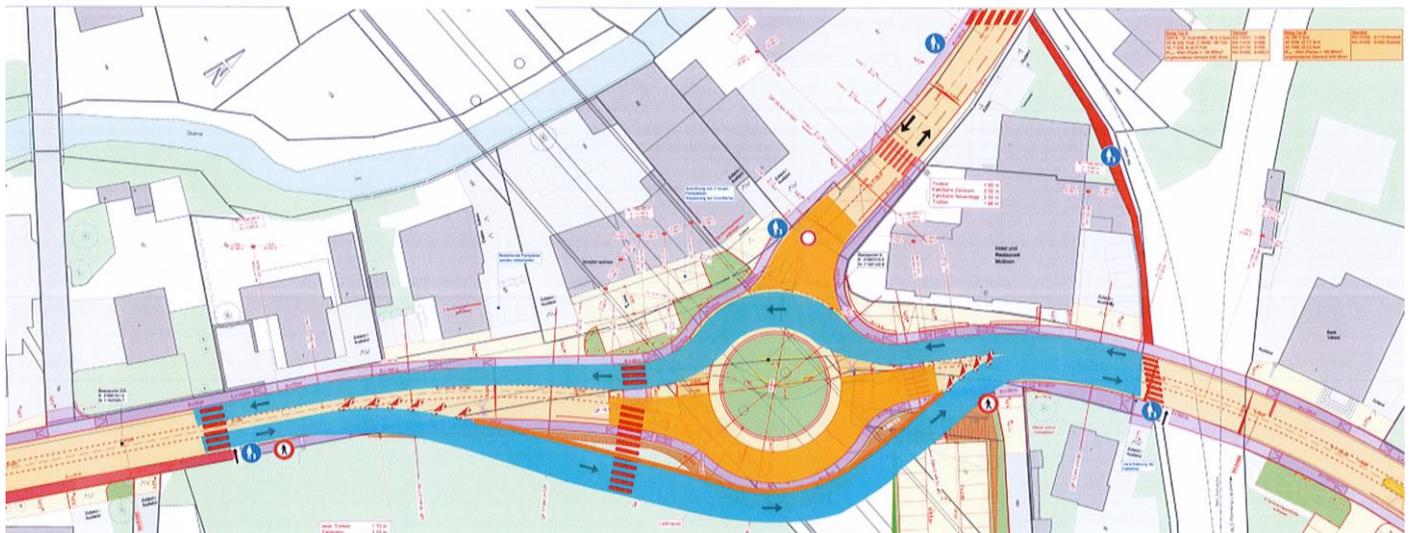



Phase 1.3''

- Arbeitsbereich
- Fahrbahn
- Fussgänger Umleitung

22.04.2024 - 03.05.2024

