

Valtraloc Flamatt – 05.12.2024



Letzte und aktuelle Arbeiten

Kreisel, Freiburgstrasse und Neueneggstrasse

- Alle Arbeiten bis auf die Markierung sind abgeschlossen



Bernstrasse

Etappe 3

- Alle Arbeiten auf der Strasse bis auf den Deckbelag und die Markierungen sind abgeschlossen

Etappe 4.1

- Alle Arbeiten auf der Strasse bis auf den Deckbelag und die Markierungen sind abgeschlossen

Etappe 4.2

- Diverse Werkleitungsarbeiten wurden erledigt
- Die Randsteine und die Baumgruben wurden erstellt
- Der Belageeinbau erfolgte am 05.12. 2024



Etappe 5+6 (Strasse)

- Die Trag- und Binderschichten (Belag) wurden am 7.11.2024 und am 14-15.11.2024 eingebaut



Etappe 5.1 (Trottoir)

- Anpassungen am Swissscomschacht sind im Gange
- Umgebungsarbeiten und Vorplätze bei den Gebäuden 22+24+26+28 sind in Arbeit
- Belageinbau Vorplatz 22-24 und Parkplatz 26 abgeschlossen




Etappe 7.2 (Strasse)

- Strassenquerungen für die öffentliche Beleuchtung wurden erstellt.
- Die Mittelinsel beim Autobahnkreisel wurde rückgebaut und der Kandelaber umgesetzt
- Anpassungen diverser Schächte sind in Arbeit

Aktuelle Verkehrsphase

Die Etappe 4 konnte aufgrund mangelnder Platzverhältnisse und hohem Fussgängeraufkommen nicht mit zweispurigem Verkehr gebaut werden. Ab dem 23. Oktober 2024 wurde daher ein Einbahnverkehr eingeführt in Richtung Wünnewil.

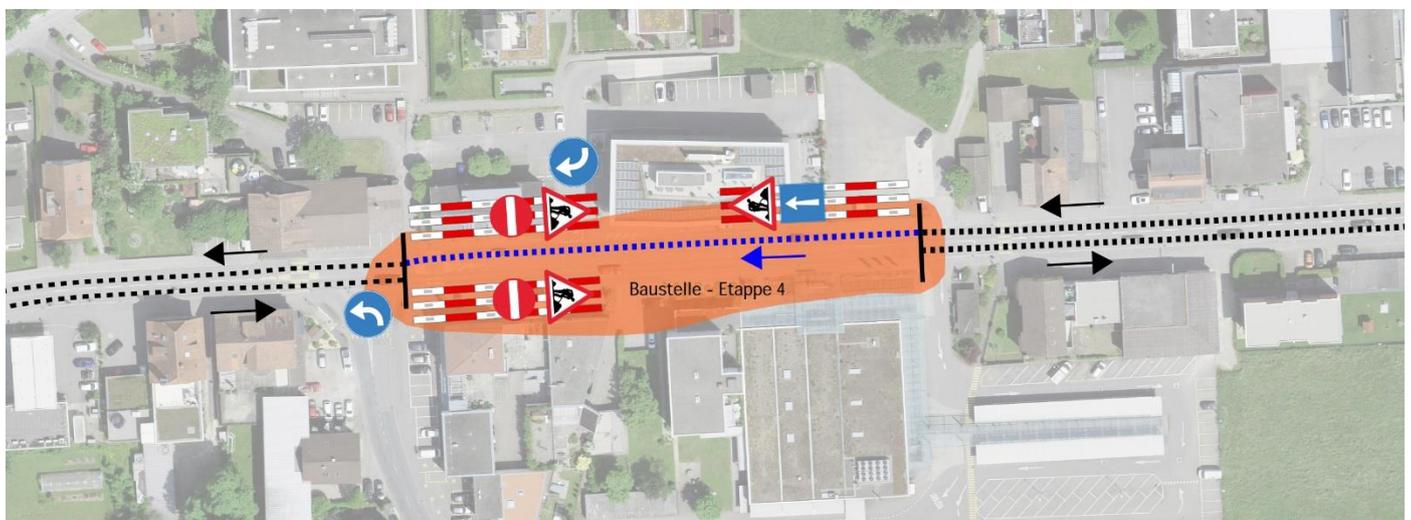

Diese Verkehrsführung wird ab dem 13. Dezember aufgehoben.

Die Geschwindigkeit im Baustellenbereich ist auf 30 km/h reduziert, um die Sicherheit aller Teilnehmer zu gewährleisten.

Anstehende Arbeiten

Vom 20.12.2024 bis am 15.01.2024 wird die Baustelle geschlossen.

Bernstrasse

Etappe 4.2

- Einlaufschächte fertigstellen
- Randsteine um die Baumlöcher
- Planie Strasse fertigstellen um am 05.12.24 die Trag- und Binderschichten
- Schützen der Glasfassade der Raiffeisenbank
- Planie Gehweg vor Raiffeisenbank (je nach Witterung)
- Einbau Belag auf dem Gehweg Raiffeisenbank ist am 12.12.24
- Vorbereitungen für die Winterpause

Etappe 5.1

- Swisscomschacht fertigstellen
- Anpassungen bei der Bernstrasse 26+28 fertigstellen
- Bordüren erstellen
- Vorplatz Bernstrasse 22-24 erstellen und Vorbereitungen für den Belagseinbau
- Erstellen neuer Umschlagplatz und Aufhebung alter Umschlagplatz neben dem Coop Pronto
- Erstellen vom Parkplatz Bernstrasse 28 und der neuen Einfahrt des Coop Pronto
- Vorbereitungen für die Winterpause

Etappe 7.2

- Diverse Schächte auf der Mittelinsel verschieben und anpassen
- Rückbau der Randabschlüsse, erstellen der Einlaufschächte und neuen Randabschlüsse auf der Juraseite
- Vorbereitungen für die Winterpause

Kommende Verkehrsphase

Es sind bis auf weiteres keine Eingriffe in den Verkehr geplant, dieser wird ab dem 13.12.2024 zweispurig durch Flamatt geführt. Bei der nächsten Verkehrsführungsänderung wird frühzeitig kommuniziert.
