

Stand Januar 2024

Letzte und aktuelle Arbeiten


Trotz den schlechten Wetterbedingungen vom Jahresende konnte der Kreisel am 22.12.23 provisorisch in Betrieb genommen werden, die Neueneggstrasse wiedereröffnet werden und die Baustelle bis am 18.01.24 winterfest gemacht werden.

Phase 1 – Kreisel und Neueneggstrasse

- Bau vom befahrbaren Kreiselring ist erfolgt
- Provisorische Markierungen für die Winterpause
- Diverse Werkleitungsarbeiten wurden gemacht
- Koffersersatz auf der Neueneggstrasse
- Belageinbau auf der Neueneggstrasse und im Kreiselbereich.



Aktuelle Verkehrsphase

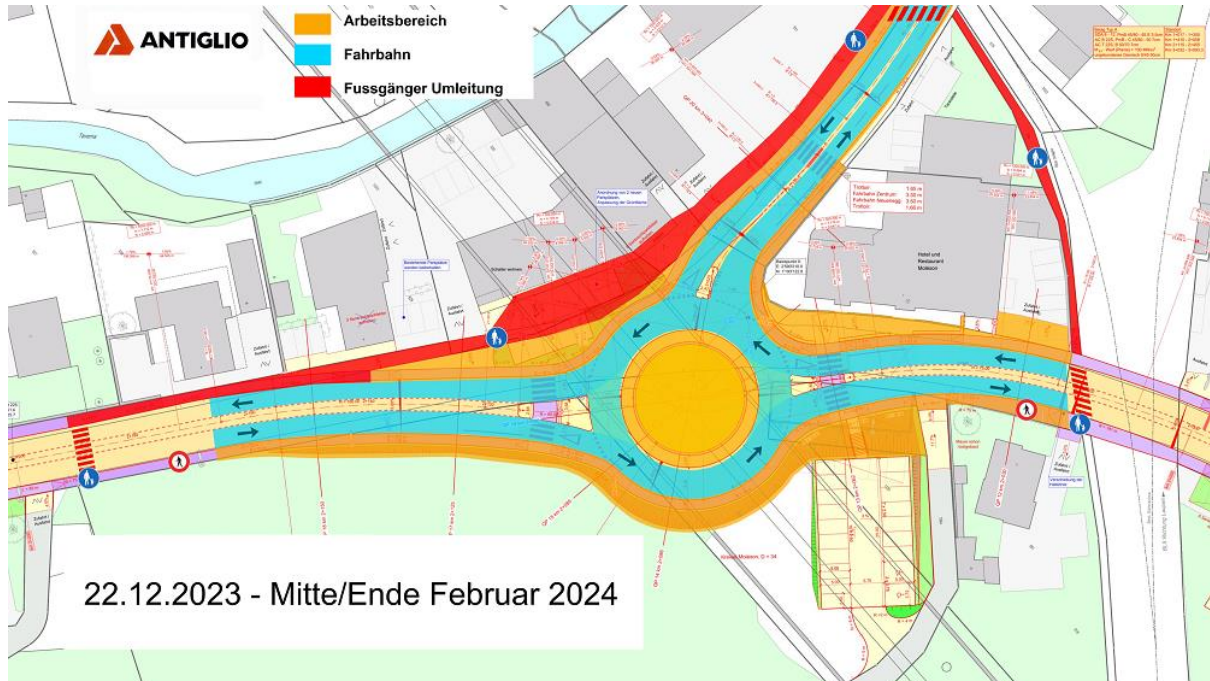

Wichtige Infos

Die Geschwindigkeit im Kreiselbereich wird auf 30 km/h reduziert, um die Sicherheit aller Teilnehmer zu gewährleisten.

Anstehende Arbeiten

Die kommenden Arbeiten sind die folgenden:

Phase 1 – Kreisel und Neueneggstrasse

- Ausschalen Kreisling

Phase 2 - Freiburgstrasse

- Start mit den Arbeiten für die neuen Bordüren
- Punktuelle Strassenquerungen für die Trinkwasserleitungen

Kommende Verkehrsphase

Bis Mitte Februar wird es, ausser punktuelle Strassenquerungen auf der Freiburgstrasse, keine grösseren Eingriffe in den Verkehr geben.
